



LE DÉPARTEMENT

## USAGES NUMÉRIQUES

HOTEL DU DEPARTEMENT

Salle Laurent Bonnevey

---

### COMITE DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

14 février 2019 - 9 h

---

**PARTICIPANTS :** Daniel VALÉRO, Vice-Président délégué aux nouvelles technologies, Daniel POMERET, Président du SRDC, Cyrille-Frantz HONEGGER, Directeur Régional SFR, Marie-Claude FOUCRÉ, Déléguée Régionale ORANGE, Hervé CRÉTIN, Directeur des relations collectivités locales ORANGE, Bertrand MAIGNIER, Déploiement FTTH ORANGE, John HOULIER Déploiement FTTH SFR, Sébastien NOURRY, Chargé d'Affaires Habitat Collectif SFR, Romain DÉGLISE, Relations Collectivités SFR, André GOY, DG Département du Rhône, Pierre FOURNIER, DUN Rhône, PICHET Nathalie, SGAR Chargée de Mission, MANROUBIAA-ORTEOUS, Jean-Baptiste SGAR, Chargé Numérique, Guy HOFSTETTER, COR Vice-Président, CHONÉ Jean-Philippe, CCPO Vice-Président, MARTINET Guy, VIENNE CONDRIEU AGGLO Vice-Président, BATALLA Diogène, CCPA Vice-Président, GEOFFRIY Patrice, Commune de BESSENAY, FOURNIER Sophie, CCEL, ARIZA Yann, CCVG DSI, HUMBERT Guillaume, VIENNE CONDRIEU AGGLO DSI en charge du suivi déploiement FTTH, MARION Rémy, CCPA Chargé de mission numérique, Patrick MOSTEFAOUI, Directeur EPARI, Simon POTOK, EPARI.

Un comité de suivi est mis en place pour s'assurer de la bonne exécution des conventions signées avec Orange et SFR. Il se réunit deux fois par an (article 11-3), en février et septembre. Chaque CPSD semestriel est un « temps de passage » des opérateurs par rapport aux objectifs finaux de livraison en 2020-2022 sur toutes les communes du département du Rhône.


Monsieur Daniel VALÉRO, Vice-Président délégué aux nouvelles technologies ouvre la séance et propose d'aborder la réunion en déroulant l'ordre du jour qui commence par SFR, il propose également que les questions diverses soient traitées opérateur par opérateur.

#### **1. Point par SFR, de ses déploiements à ce jour, avancement par rapport au plan initial et programmation 2019.**


Cyrille-Frantz HONEGGER, Directeur Région Centre Est d'Altice SFR, présente la nouvelle organisation chargée du déploiement FTTH sur le Rhône et son suivi. La nouvelle société créée par le groupe se nomme SFR FTTH et c'est elle qui a en charge ce déploiement. Le responsable de projet est monsieur John HOULIER. Le responsable des conventionnements collectifs est monsieur Richard NOURRY.

Deux personnes ont été recrutées pour assurer les relations avec les collectivités locales dans la région, dont une sera en poste plus spécifiquement dans le Rhône et la Métropole de Lyon.


La logique industrielle de déploiement a amené à revoir le calendrier de certaines communes pour un travail par plaque. L'échéance 2020-2022 sera entièrement respectée. Ci-dessous la carte des déploiements et le calendrier

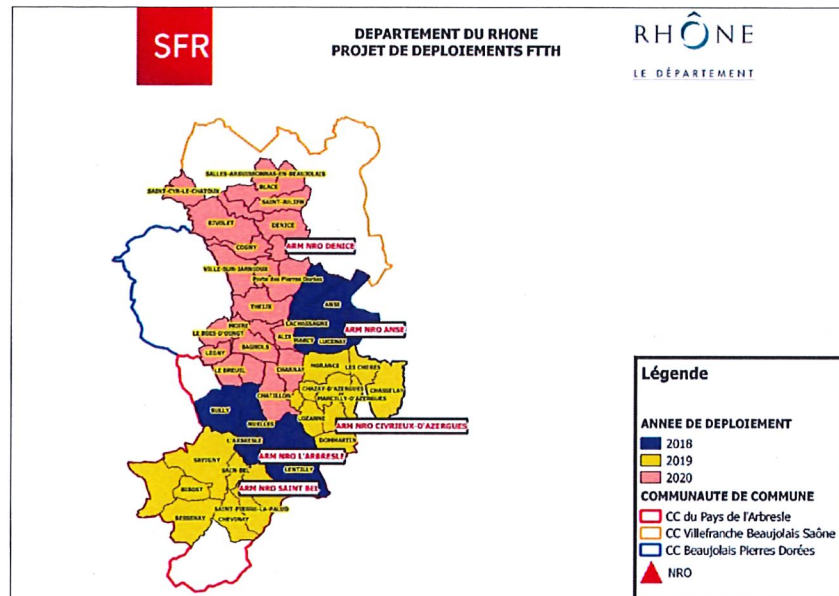


- L'ensemble des communes traitées par SFR dans **l'Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône** le sera en 2020 y compris St Julien initialement prévu en 2018.

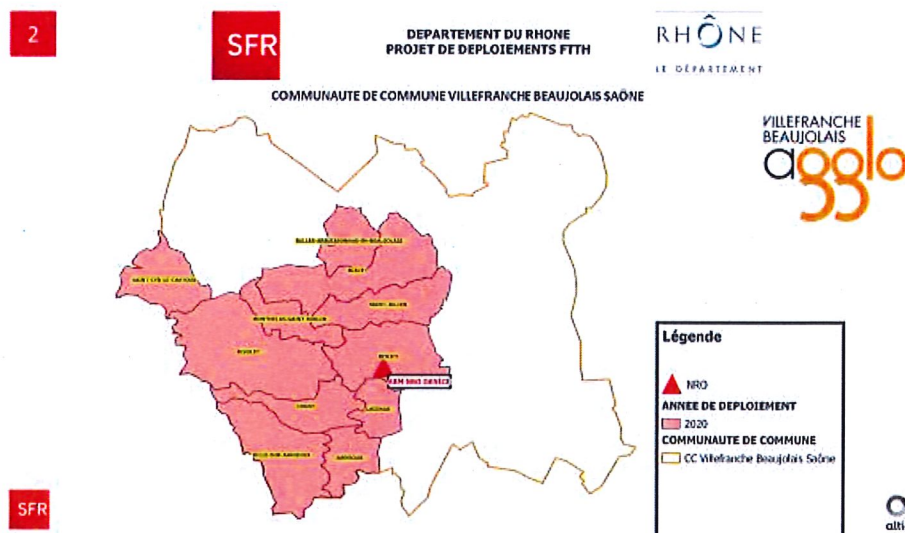

- **Communauté de communes de Beaujolais Pierres Dorées** est découpée en 3 zones 2018/ 2019/ 2020. La collecte est construite avant commercialisation au printemps sur le secteur 1.

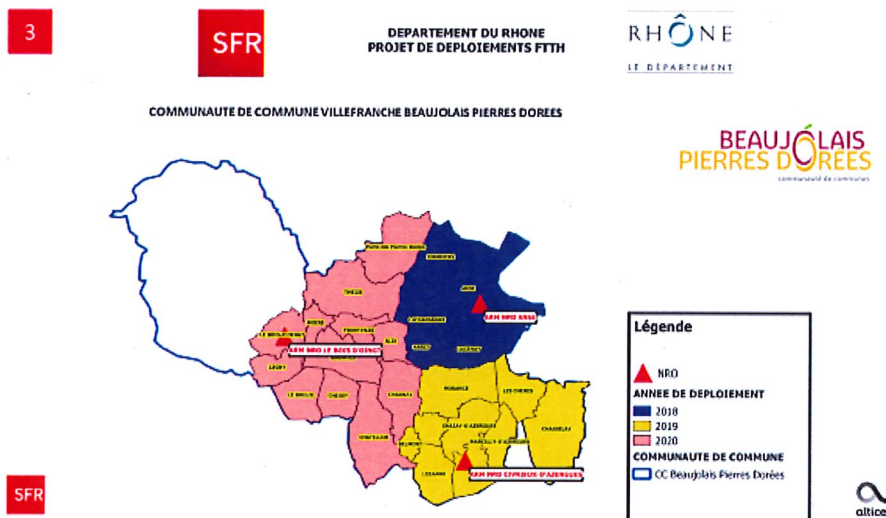

- **Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle** Les PMs sont posés avec commercialisation sur secteur 1 au printemps également.

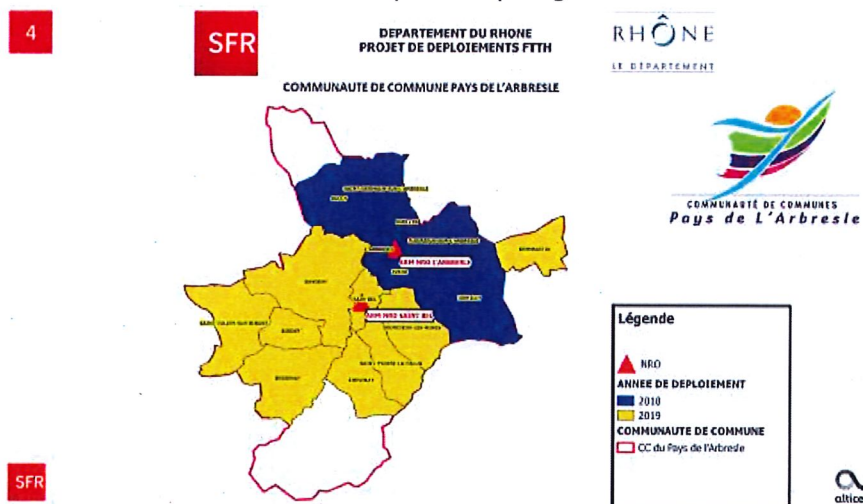



John HOULLIER confirme une mise en service des premiers secteurs à Anse et L'Arbresle début mars 2019.

Il présente des tableaux de suivi des 54 communes traitées par SFR.

5

DEPLOIEMENT FTTH DE 54 COMMUNES  
PLANNING DEPLOIEMENT 2019

Communauté de Communes	Communes	Pose PM	Tirage et raccordement ZAPM (Zone arrière PM)	Nb logements fin 2018
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées	Anse	Septembre 2018 - Décembre 2018	Juillet 2018 - Décembre 2018	4 292
	Lucenay			
	Pommiers			
	Ambérieux			
	Lachassagne			
	Marcy			
Communauté de Communes Pays de l'Arbresle	L'Arbresle	Septembre 2018 - Mars 2019	Septembre 2018 - Décembre 2018	5 124
	Bully			
	Saint-Germain-Nuelle			
	Fleurbaey-sur-l'Arbresle			
	Lentilly			
	Éveux			

N.B. : la livraison des travaux des communes citées ci-dessus seront finalisés à 100 % au cours du mois de février 2019 hors travaux VTL qui sont liés aux conventionnements des immeubles (Parc OPAC, Asl ect...)

SFR

C  
alt

5

DEPLOIEMENT FTTH DE 54 COMMUNES  
PLANNING DEPLOIEMENT 2019

Communauté de Communes	Communes	Pose PM	Tirage et raccordement ZAPM (Zone arrière PM)	Nb logements fin 2019
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées	Civrieux-d'Azergues	Janvier 2019 - Avril 2019	Janvier 2019 - Avril 2019	5 285
	Belmont-d'Azergues			
	Morancé			
	Lozanne			
	Chazay-d'Azergues			
	Dommartin			
	Les Chères			
	Marcilly-d'Azergues			
	Saint-Jean-des-Vignes			

N.B. : les travaux sur les communes de la ZA-NRO de Saint-Del seront entamés à partir du mois de Mai 2019 (cible de 6400 prises).

SFR

altice



Daniel VALÉRO indique qu'en cas de problème rencontrés dans les phases de déploiement il faut remonter l'information rapidement à l'EPARI pour intervention en appui.

Il demande que l'opérateur prenne rapidement contact avec les communes dont le programme a été retardé pour leur apporter l'information et des explications sur ce nouveau calendrier.

Cyrille-Frantz HONEGGER indique que le nouveau chargé de relations avec les collectivités aura pour mission de rencontrer les communes et les informer.

John HOULIER présente l'avancement des travaux sur les communes en cours de travaux, un point sera fait à chaque fois commune par commune.

5

DEPLOIEMENT FTTH DE 54 COMMUNES  
AVANCEMENT AU 31/12/2018

■ Avancement déploiement NRO ANSE :

VILLES	PM	% Travaux Seul	% Travaux Adrien	% Recouvrement Seul	% Recouvrement Adrien
ANSE	PM001	100%	80%	100%	80%
ANSE	PM002	100%	90%	100%	80%
ANSE	PM003	100%	100%	100%	90%
ANSE	PM004	100%	60%	70%	100%
ANSE	PM005	100%	100%	100%	100%
ANSE	PM006	90%	100%	90%	100%
ANSE	PM007	100%	80%	90%	60%
ANSE	PM008	100%	100%	80%	100%
LYMMEZ	PM001	100%	80%	90%	70%
LYMMEZ	PM002	90%	80%	90%	60%
LYMMEZ	PM003 nouveau	100%	90%	60%	90%
LUCENAY	PM001	50%	60%	90%	60%
LUCENAY	PM002	100%	60%	90%	60%
MOUCY	PM001	90%	90%	90%	90%
LA CHANZEMME	PM001	90%	90%	90%	90%
AMBIETTES	PM001	80%	80%	80%	80%

SFR

altice


- **Avancement déploiement NRO L'ARBRESLE :**

VALUES	PM	% Fringe Soul	% Fringe Admin	% Paracordment Soul	% Paracordment Admin
1. WOODSLEY	PM001	80%	84%	97%	95%
1. WOODSLEY	PM002	80%	84%	88%	97%
1. WOODSLEY	PM003	80%	Can't Admin	97%	88%
1. WOODSLEY	PM004	80%	80%	87%	95%
1. WOODSLEY	PM005	80%	88%	88%	97%
1. WOODSLEY	PM006	80%	87%	97%	85%
1. WOODSLEY	PM007	80%	80%	77%	78%
1. WOODSLEY	PM008	80%	84%	88%	95%
1. WOODSLEY	PM009	80%	47%	77%	88%
1. WOODSLEY	PM010	80%	47%	80%	93%
1. WOODSLEY	PM011	80%	78%	87%	77%
1. WOODSLEY	PM012	80%	80%	87%	78%
1. WOODSLEY	PM013	80%	80%	87%	94%
1. WOODSLEY	PM014	80%	77%	87%	77%
1. WOODSLEY	PM015	80%	78%	87%	93%
1. WOODSLEY	PM016	80%	77%	87%	87%
1. WOODSLEY	PM017	80%	77%	87%	87%
1. WOODSLEY	PM018	80%	47%	47%	95%
1. WOODSLEY	PM019	80%	80%	47%	78%
1. WOODSLEY	PM020	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM021	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM022	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM023	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM024	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM025	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM026	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM027	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM028	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM029	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM030	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM031	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM032	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM033	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM034	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM035	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM036	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM037	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM038	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM039	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM040	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM041	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM042	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM043	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM044	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM045	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM046	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM047	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM048	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM049	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM050	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM051	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM052	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM053	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM054	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM055	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM056	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM057	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM058	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM059	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM060	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM061	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM062	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM063	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM064	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM065	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM066	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM067	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM068	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM069	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM070	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM071	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM072	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM073	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM074	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM075	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM076	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM077	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM078	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM079	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM080	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM081	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM082	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM083	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM084	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM085	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM086	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM087	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM088	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM089	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM090	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM091	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM092	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM093	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM094	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM095	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM096	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM097	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM098	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM099	80%	80%	87%	85%
1. WOODSLEY	PM100	80%	80%	87%	85%

SFR



Sébastien NOURRY présente l'avancement dans le conventionnement avec les logements collectifs permettant la pénétration de la fibre dans la copropriété verticale ou horizontale, à ce jour, 4275 logements sont signés, 4900 restent à conventionner notamment avec le bailleur HBVS et plusieurs syndicats privés. Il demande à ce que les mairies par leur communication locale et tous moyens qu'elles jugeront utiles informent les ASL de l'urgence de conventionner avec SFR en tant que constructeur de réseau FTTH mutualisé.

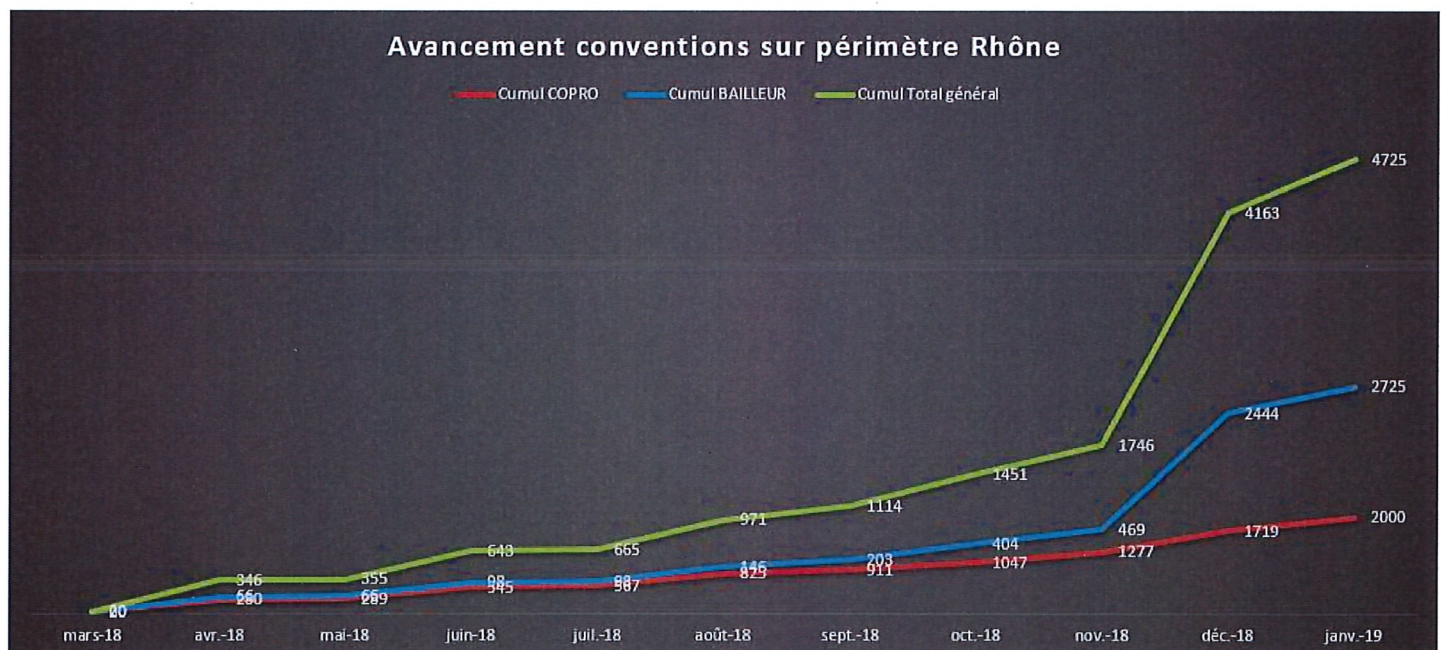

En rouge les copropriétés et lotissements, en bleu les bailleurs sociaux tels que OPAC, SEMCODA, 3F...en vert le cumul.

**Le Point 3 de l'ordre du jour, effacement des doublons de mobilier urbain sur quelques communes et mode opératoire entre les deux opérateurs, est abordé ici du fait de l'intervention de SFR qui ne restera pas pour la présentation d'Orange.**

Cyrille-Frantz HONEGGER : Le contexte de déploiement par chaque opérateur avant les accords passés depuis a entraîné une double infrastructure à Anse, Lachassagne, Lucenay et Ambérieux. A Anse, à la suite de d'un accord national, Orange enlève ses armoires. Pour les 3 autres communes, le réseau sera cédé par Orange à SFR et soit les armoires posées sont utilisables par SFR, soit elles seront démontées par SFR.

Hervé CRÉTIN, ORANGE : A Ambérieux il y a déjà des abonnés en service, il ne faudrait pas les débrancher. Idem à Jons.

Marie-Claude FOUCRÉ, ORANGE : D'ici mi-juillet 2019, toutes les données Orange de ce secteur devront être versées dans les bases de données SFR.

Daniel POMERET : On ne peut que se féliciter du démontage des armoires en doublon à Anse.

John HOULIER : à Bessenay il y a 4 armoires déployées par ORANGE. Celles-ci sont rétrocédées à SFR. Il y aura un audit technique sur les infrastructures avant réutilisation.

Daniel VALÉRO : Il ne subsistera pas de doublons sur l'ensemble du déploiement.

Hervé CRÉTIN : Nous avons par ailleurs adressé au Président du Département un courrier formel indiquant que c'est bien SFR qui déploie sur 54 communes où les deux opérateurs étaient présents et déployaient en doublon.. La convention signée par Orange sur les 54 communes est donc de ce fait caduque et a été résiliée de facto par Orange.

## **2. Point par ORANGE, par commune, de ses déploiements à ce jour, avancement par rapport au plan initial, et programmation 2<sup>ème</sup> semestre 2019.**

Daniel VALÉRO : Les communes qui doivent être traitées en 2019 attendent un contact rapide pour présentation du projet, Il est nécessaire de les rencontrer rapidement. Hervé Crétin précise que 85 communes seront engagées en chantier en 2019. Elles seront toutes informées d'ici fin avril 2019.

Hervé CRÉTIN présente l'organisation d'Orange sur la Région et sur le Département du Rhône :

Marie-Claude FOUCRÉ assure la Direction en tant que déléguée régionale, Hervé CRÉTIN les relations avec les collectivités locales, Bertrand MAIGNIER adjoint responsable des chargés d'affaires FTTH. Un Bureau d'Etudes Orange avec une structure de 90 personnes, basée à St Priest est dédiée au FTTH ainsi que 7 sociétés de travaux afin de respecter l'engagement de travaux :

Par ailleurs les communes sont rencontrées au fur et à mesure des présentations de projet par les sociétés de travaux qui peuvent être accompagnées par un responsable ORANGE si besoin.

Marie Claude Foucré insiste sur la consistance du programme 2019, qui vise à répondre aux exigences d'échéance d'équiper techniquement tout le territoire d'ici fin 2020 et d'ouvrir toutes les prises à la commercialisation d'ici fin 2022. L'année 2019 est par conséquent charnière et chargée, en nombre de prises comme en nombre de communes.



L'engagement est le suivant :

zone AMII

## Orange s'engage sur ses déploiements FTTH en France

Ces engagements sont opposables d'une manière légale et d'une manière conventionnelle.

<b>Convention AMII</b> convention de programmation et de suivi des déploiements FttH Engagements sur les territoires où la convention a été signée	<b>Engagement L 33-13</b> Engagements opposables sur les déploiements FttH en zone AMII	<b>Arcep</b> Décision 2010-1312 Règle de la complétude des PM sous 5 ans
Engagement local	Engagement national	Engagement national

**Fin 2020** : 100 % **raccordables** (commercialisables) ou **raccordables sur demande** (éligible commercialement à une offre FttH et pouvant être rendu raccordable sous 6 mois), **hors refus des tiers**

**Fin 2022** : 100 % **raccordables** (hors refus des tiers)

5 Orange

(Oingt et St Laurent d'Oingt font maintenant partie de la commune nouvelle de Val d'Oingt, elles étaient prises par Orange dans le cadre de l'AMII de janvier 2011, elles sont traitées par Orange indépendamment des autres communes du regroupement dont le déploiement est réalisé par SFR)

## Le cadre de la convention AMII signée avec le Rhône

Convention signée en Mars 2018

Le Rhône a délibéré le 14 décembre pour la signature d'un avenant (de programmation et de suivi des déploiements FttH) proposé par l'Agence du Numérique, sur les 168 communes en charge d'Orange

- Modification de l'annexe 3 « volumes annuels »
- Nouvelle base Insee 2014  
**162.712 logements** (contre 153.235 en Insee 2010)
- Date de démarrage des études et travaux par commune (déjà fixé)
- Calendarisation des volumes de logements adressables et raccordables

- Mention de Riverie (hors AMII) en déploiement 2020 tout comme Oingt et St Laurent Oingt

6 Orange

## Le cadre de la convention AMII et son avenant

Les volumes annuels pour le Rhône (sur 168 communes)

des locaux programmés, raccordables sur demande et raccordables (annexe 3)

**Fin 2020** : 100% programmés

des raccordables sur demande à partir de début 2021

Année	Volume de locaux programmés		Volume minimum de locaux raccordables		Volume maximum de locaux raccordables sur demande		Volume de locaux en aval PM non encore raccordables <sup>1</sup>	
	Nombre de locaux	% du total des locaux	Nombre de locaux	% du total des locaux	Nombre de locaux	% du total des locaux	Nombre de locaux	% du total des locaux
2018	69 239	43%	33 256	20%	24 407	15%	11 575	7%
2019	140 889	87%	61 320	38%	24 407	15%	55 162	34%
2020	162 712	100%*	137 817	85%	24 895	15%		
2021	162 712	100%*	151 648	93%	11 064	7%		
2022	162 712	100%*	162 712	100%*	0	0%		

<sup>1</sup> Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.)

\* 100% : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus des tiers ou équivalents

7 Orange

**Fin 2022** : 100% raccordables

Daniel VALÉRO : Il est à noter qu'ORANGE traite maintenant aussi bien les entreprises que les particuliers, la notion de logements raccordables, remplacée par locaux raccordables prend en compte l'ensemble.

## Le Suivi de la convention AMII : EPCI par EPCI à fin 2018

RHÔNE LE DÉPARTEMENT	Nb lgts insee 2014	Nombre total de PM à terme	Nbre de PM restant à faire	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition au 31/12/2018	Nombre total de locaux programmés au 31/12/2018	Nombre de locaux Raccordables	Comparaison	
								locaux programmés 31/05/2018	croissance
CA de Villefranche Beaujolais Saône	27406	91	14	4	73	27524	14689	17824	54%
CC de la Vallée du Garon	12556	51	0	0	51	17778	9223	17778	0%
Vienne Condrieu Agglo	8854	29	16	1	12	4686	946	2016	132%
CC du Pays de l'Ozon	10242	34	30	0	4	1649	1033	1636	1%
CC du Pays Mornantais	11441	37	15	4	18	6242	1616	3952	58%
Saône Beaujolais	21070	80	60	4	16	6417	2668	3444	86%
CC Ouest Rhodanien	26615	85	74	11	0	0	0	0	0%
CC Beaujolais Pierre Dorées	2425	11	11	0	0	0	0	0	0%
CC des Vallons du Lyonnais	11803	40	26	3	11	3523	797	1758	100%
CC Monts du Lyonnais	14094	50	41	0	9	3078	754	1190	159%
Pays de l'Arbresle	1030	4	3	1	0	0	0	0	0%
CC de l'Est Lyonnais	15174	50	20	2	28	9836	6332	9519	3%
TOTAL AMII Rhône	162710	562	310	30	222	80733	38058	59117	37%
Hors AMII Rhône	5685	12	0	9	12	3754	265		

10 Orange




## Le Suivi de la convention AMII : EPCI par EPCI à fin 2018

dans le Rhône au 31/12

- **38 058** locaux raccordables (objectif **33.256**)
- **et 80.733** locaux programmés (objectif **69.239**)  
sur un total de 162.264 locaux (Insee 2014)
- **222** armoires PM déployées et **30 en cours**
- **24** communes déjà commercialisées, **14 en cours**
- **85 communes en études / travaux prévues en 2019**

La cour de progression du déploiement depuis 2017 à fin 2019 est la suivante :

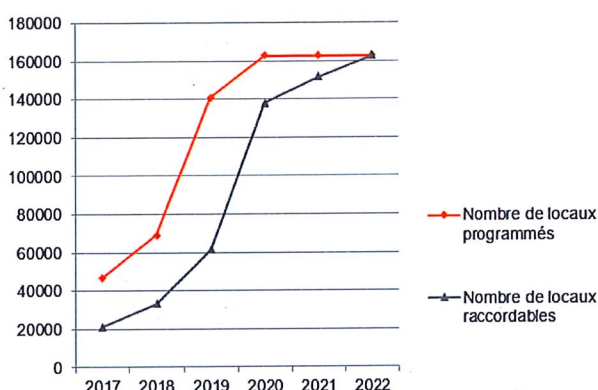

fin 2017,  
**21.135 logements et locaux ont accès à la Fibre**

fin 2018,  
**38.058 logements et locaux ont déjà accès à la Fibre**  
**et 80.733 logements et locaux sont adressables**

fin 2019,  
**61.320 logements et locaux auront accès à la Fibre**  
**et 140.889 logements et locaux seront adressables**

### Communes FTTH couvertes par la fibre Orange : armoires posées et fibrées

en 2015 et 2016 5 communes	en 2017 +9 communes = 14	en 2018 +14 communes = 28	en 2019 +2 communes
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Villefranche sur Saône (oct 2015) en partie</li> <li>-Arnas (juillet 2016)</li> <li>-Gleizé (juillet 2016)</li> <li>-Belleville (sept 2016)</li> <li>-Sérézin Rhône (oct 2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Brignais (mars 2017)</li> <li>-Chaponost (mai 2017)</li> <li>-Millery (fév 2017)</li> <li>-Montagny (mai 2017)</li> <li>-Vourles (mai 2017)</li> <li>-Messimy (mai 2017)</li> <li>-Orliénas (mars 2017)</li> <li>-Genas (mars 2017)</li> <li>-Saint Georges de Reneins (mars 2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Saint Romain en Gal (mai 2018)</li> <li>-Sainte Colombe (mai 2018)</li> <li>-Saint Bonnet de Mure (mai 2018)</li> <li>-Saint Symphorien/Coize (mai 2018)</li> <li>-Mornant (mai 2018)</li> <li>-Taluyers (nov 2018)</li> <li>-Condrieu (fév 2019)</li> <li>-Limas (fév 2019) - Brindas (fév 2019)</li> <li>+ChassagnyBeauvallon (mars 2019)</li> <li>+Saint Andéol Château (mars 2019)</li> <li>+Dareizé + St Loup (mai 2019)</li> <li>+Jons (ouverte en octobre 2018)</li> </ul>	<p>Report de <u>Monsols</u> <u>St Igny de Vers</u> suite aux travaux dans le Haut Beaujolais</p> <p>Programme engagé de 85 nouvelles communes pour 2019</p>
<p>Communes couvertes Par la fibre dans le Rhône</p> <p>Réalisé Fin 2016 : <b>5 (Villefranche partiel)</b>  Réalisé Fin 2017 : <b>14 (+9 nouvelles)</b>  Réalisé Fin 2018 : <b>28 communes (+12 en cours)</b>  Obj. Fin 2019 : <b>123 (+83 nouvelles)</b>  Obj. Fin 2020 : <b>168 (+45 nouvelles)</b></p>			
<p><b>12 Communes 2018 retardées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Saint Laurent d'Agnay</li> <li>-La Chapelle sur Coise+Coise</li> <li>-Les Olmes</li> <li>-Grézieu-le-Marché</li> <li>-Pomeys - Saint Verand</li> <li>-Courzieu</li> <li>-Brussieu</li> <li>-Thizy-les-Bourgs</li> <li>-St Jean-la-Bussière</li> <li>-Tarare en Juin 2019</li> </ul>			



Le programme à venir :

## Le programme de l'année 2019 à venir :

Code INSEE	EPCI	Commune	Début d'exploitation	Localité INSEE 2019	Fin d'exploitation
69001	CA de l'Ouest Rhodanien	Affoux	2018	154	2020
69008	CA de l'Ouest Rhodanien	Ancy	2018	282	2020
69054	CA de l'Ouest Rhodanien	Châteaulet	2018	250	2020
69060	CA de l'Ouest Rhodanien	Craveissilles	2018	374	2020
69066	CA de l'Ouest Rhodanien	Cours-la-Ville	2018	2 790	2020
69107	CA de l'Ouest Rhodanien	Lamure-sur-Azergues	2018	548	2020
69130	CA de l'Ouest Rhodanien	Mesux-la-Montagne	2018	155	2020
69157	CA de l'Ouest Rhodanien	Pontcharra-sur-Turdine	2018	1 199	2020
69180	CA de l'Ouest Rhodanien	Pouébois-Echampt	2018	627	2020
69184	CA de l'Ouest Rhodanien	Ranchal	2018	286	2020
69183	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Bonnet-le-Troncy	2018	225	2020
69200	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Forgeux	2018	706	2020
69225	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Marcel-l'Éclairé	2018	230	2020
69229	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Nizier-d'Azergues	2018	470	2020
69234	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Romain-de-Popey	2018	682	2020
69240	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Vincent-de-Reins	2018	446	2020
69243	CA de l'Ouest Rhodanien	Tamre	2018	5 838	2020
69007	CA Vienne Condrieu	Ampuis	2018	1 208	2020
69080	CA Vienne Condrieu	Échalas	2018	665	2020
69097	CA Vienne Condrieu	Les Haies	2018	319	2020
69118	CA Vienne Condrieu	Lairac-sur-Rhône	2018	1 098	2020
69119	CA Vienne Condrieu	Longes	2018	386	2020
69193	CA Vienne Condrieu	Saint-Cyr-sur-Rhône	2018	502	2020
69236	CA Vienne Condrieu	Saint-Romain-en-Gier	2018	241	2020
69252	CA Vienne Condrieu	Trèves	2018	284	2020
69253	CA Vienne Condrieu	Tupin-et-Sémons	2018	261	2020
69151	CA Villefranche-Beaujolais-Saône	La Perrière	2018	650	2020
69197	CA Villefranche-Beaujolais-Saône	Saint-Étienne-des-Oullières	2018	881	2020
69257	CA Villefranche-Beaujolais-Saône	Vaux-en-Beaujolais	2018	489	2020
69230	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Sainte-Paule	2018	155	2020
69299	CC de l'Est Lyonnais (CCEL)	Colombier-Saugnieu	2018	974	2020
69288	CC de l'Est Lyonnais (CCEL)	Saint-Laurent-de-Mure	2018	2 199	2020
69289	CC de l'Est Lyonnais (CCEL)	Saint-Pierre-de-Chandieu	2018	1 662	2020
69298	CC de l'Est Lyonnais (CCEL)	Toussieu	2018	1 051	2020
69030	CC des Monts du Lyonnais	Brullat	2018	394	2020
69098	CC des Monts du Lyonnais	Les Halles	2018	208	2020
69120	CC des Monts du Lyonnais	Longessaigne	2018	300	2020
69132	CC des Monts du Lyonnais	Meys	2018	370	2020
69139	CC des Monts du Lyonnais	Montastrier	2018	715	2020
69164	CC des Monts du Lyonnais	Sainte-Catherine	2018	460	2020
69220	CC des Monts du Lyonnais	Saint-Laurent-de-Chamousset	2018	842	2020
69178	CC des Monts du Lyonnais	Sauzy	2018	348	2020
69263	CC des Monts du Lyonnais	Villechenève	2018	438	2020

Code INSEE	EPCI	Commune	Début d'exploitation
69094	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Grézieu-la-Varenne	2018
69154	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Pollionnay	2018
69190	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Sainte-Consoise	2018
69249	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Thurins	2018
69256	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Vaunoy	2018
69269	CC des Vallons du Lyonnais (CCVL)	Yzeron	2018
69173	CC du Pays de l'Arbresle (CCPA)	Sarcey	2018
69270	CC du Pays de l'Ozon	Chaponnay	2018
69272	CC du Pays de l'Ozon	Communay	2018
69281	CC du Pays de l'Ozon	Marnas	2018
69291	CC du Pays de l'Ozon	Saint-Symphorien-d'Ozon	2018
69296	CC du Pays de l'Ozon	Simandres	2018
69297	CC du Pays de l'Ozon	Ternay	2018
69051	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Chausson	2018
69170	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Rontalon	2018
69180	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Saint-André-la-Côte	2018
69213	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Saint-Jean-de-Toulas	2018
69228	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Saint-Maurice-sur-Dargoire	2018
69002	CC Saône-Beaujolais	Aiguespisse	2018
69016	CC Saône-Beaujolais	Azolette	2018
69035	CC Saône-Beaujolais	Cenves	2018
69036	CC Saône-Beaujolais	Cerci	2018
69045	CC Saône-Beaujolais	Charentay	2018
69066	CC Saône-Beaujolais	Corcelles-en-Beaujolais	2018
69077	CC Saône-Beaujolais	Dacé	2018
69145	CC Saône-Beaujolais	Odenas	2018
69150	CC Saône-Beaujolais	Ourox	2018
69161	CC Saône-Beaujolais	Propières	2018
69182	CC Saône-Beaujolais	Saint-Bonnet-des-Bruyères	2018
69185	CC Saône-Beaujolais	Saint-Christophe	2018
69186	CC Saône-Beaujolais	Saint-Clement-de-Vers	2018
69198	CC Saône-Beaujolais	Saint-Etienne-la-Varenne	2018
69210	CC Saône-Beaujolais	Saint-Jacques-des-Améris	2018
69211	CC Saône-Beaujolais	Saint-Jean-d'Ardières	2018
69218	CC Saône-Beaujolais	Saint-Lager	2018
69224	CC Saône-Beaujolais	Saint-Mamert	2018
69242	CC Saône-Beaujolais	Tapinas	2018
69251	CC Saône-Beaujolais	Trades	2018

## Le programme de l'année 2020 :

Les volumes à produire sur les nouvelles communes (2020) : 24.000 locaux

- 45 communes
- Pour 70 armoires PM environ

Code INSEE	EPCI	Commune	Début d'exploitation	Localité INSEE 2019	Fin d'exploitation
69006	CA de l'Ouest Rhodanien	Amplepuis	2019	2 598	2020
69037	CA de l'Ouest Rhodanien	Chambost-Allières	2019	436	2020
69070	CA de l'Ouest Rhodanien	Cublize	2019	654	2020
69075	CA de l'Ouest Rhodanien	Dième	2019	80	2020
69093	CA de l'Ouest Rhodanien	Grandis	2019	622	2020
69102	CA de l'Ouest Rhodanien	Joux	2019	315	2020
69174	CA de l'Ouest Rhodanien	Les Sauvages	2019	273	2020
69186	CA de l'Ouest Rhodanien	Ronno	2019	345	2020
69181	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Appolinaire	2019	115	2020
69188	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Clément-sur-Vaissonne	2019	382	2020
69217	CA de l'Ouest Rhodanien	Saint-Just-d'Avay	2019	450	2020
69254	CA de l'Ouest Rhodanien	Vaissonne	2019	453	2020
69039	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Chamelet	2019	322	2020
69113	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Létra	2019	373	2020
69146	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Oingt	2020	323	2020
69222	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Saint-Laurent-d'Oingt	2020	386	2020
69245	CC Beaujolais-Pierres Dorées	Ternand	2019	340	2020
69014	CC des Monts du Lyonnais	Avelize	2019	458	2020
69038	CC des Monts du Lyonnais	Chambost-Longessaigne	2019	501	2020
69078	CC des Monts du Lyonnais	Duerne	2019	348	2020
69099	CC des Monts du Lyonnais	Haute-Rivoire	2019	656	2020
69110	CC des Monts du Lyonnais	Larajasse	2019	873	2020
69138	CC des Monts du Lyonnais	Montromant	2019	226	2020
69187	CC des Monts du Lyonnais	Saint-Clément-les-Places	2019	302	2020
69201	CC des Monts du Lyonnais	Sainte-Foy-l'Argentière	2019	742	2020
69203	CC des Monts du Lyonnais	Saint-Genis-l'Argentière	2019	488	2020
69227	CC des Monts du Lyonnais	Saint-Martin-en-Haut	2019	1 718	2020
69176	CC du Pays Montanais (COPAMO)	Soudieu-en-Jarez	2019	1 731	2020
69015	CC Saône-Beaujolais	Avenas	2019	71	2020
69018	CC Saône-Beaujolais	Beaujeu	2019	1 130	2020
69053	CC Saône-Beaujolais	Chénas	2019	287	2020
69058	CC Saône-Beaujolais	Chiroubles	2019	223	2020
69082	CC Saône-Beaujolais	Emeringes	2019	130	2020
69084	CC Saône-Beaujolais	Reure	2019	703	2020
69103	CC Saône-Beaujolais	Juénas	2019	479	2020
69104	CC Saône-Beaujolais	Juilly	2019	284	2020
69108	CC Saône-Beaujolais	Landé	2019	458	2020
69109	CC Saône-Beaujolais	Lantignat	2019	401	2020
69112	CC Saône-Beaujolais	Les Ardillats	2019	282	2020
69124	CC Saône-Beaujolais	Marchant	2019	276	2020
69162	CC Saône-Beaujolais	Quinolé-en-Beaujolais	2019	698	2020
69165	CC Saône-Beaujolais	Rénée-Durette	2019	509	2020
69196	CC Saône-Beaujolais	Saint-Didier-sur-Beaujeu	2019	294	2020
69258	CC Saône-Beaujolais	Vauxenard	2019	199	2020
69261	CC Saône-Beaujolais	Vernay	2019	35	2020
69267	CC Saône-Beaujolais	Villé-Monjon	2019	953	2020
69166	CC du Pays montanais	Rivière	2020	147	2020



Pour connaître son éligibilité à la fibre optique déployée par Orange des coordonnées ont été données :

Sur Internet : [https://reseaux.orange.fr/  
cartes-de-couverture/fibre-optique](https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique)

pour les professionnels de l'immobilier : **0800 38 38 84**

pour le grand public : **3900**

pour les professionnels : **3901**

**Pour connaître le suivi du déploiement sur le Rhône :  
en tant que Maire ou Collectivité locale EPCI CD69**

**Hervé Crétin**

Directeur chargé des Relations avec  
les Collectivités Locales du Rhône et Lyon Metropole



**Délégation régionale Lyon**

Orange/OF/DO/DOCE/DR LYON

téléphone bureau : 04 37 44 77 84

mobile : 06 88 06 05 86

[herve.cretin@orange.com](mailto:herve.cretin@orange.com)

Jean-Philippe CHONÉ, maire de COMMUNAY Vice-président de la CCPO délégué aux affaires économiques : Pour les constructions nouvelles doit-on préconiser l'accès au réseau fibre et uniquement à lui ?

Marie-Claude FOUCRÉ : quand un secteur sera déclaré en zone fibre, ce sera la norme, même si ce n'est pas encore le cas actuellement. Il faut nous indiquer à l'avance les futures constructions pour anticiper leur desserte. Nos armoires ont été surdimensionnées par rapport à l'existant pour être en capacité de desservir des constructions nouvelles.

Bertrand MAIGNIER : Nous faisons par ailleurs au cas par cas une étude pour vérifier s'il y aurait lieu d'ajouter une armoire.

Hervé CRÉTIN : A partir de fin 2020 il sera obligatoire de traiter les raccordables à la demande.

Rémy MARION Chargé de Mission Numérique CCPA : Cette notion de raccordable à la demande est-elle la même pour SFR ?

Patrick MOSTEFAOUI : C'est une notion identique pour tous les opérateurs, inscrite dans le cahier des charges de la convention.

Daniel VALÉRO : Nous ferons un point tous les 6 mois avec les élus départementaux pour communication aux EPCI et communes de la situation.

Hervé CRÉTIN : Pour résumer, fin 2018 nous avons déployé 220 armoires. Une vingtaine est en cours de déploiement, Il en reste à poser 320 sur la totalité du programme. 38058 locaux étaient raccordables. 80733 sont programmés. 24 communes sont commercialisées, 14 en cours de commercialisation, 85 communes entrent en études et travaux en 2018, 61320 locaux programmés en 2019. A la fin de l'année 140889 locaux seront adressables.

Patrick MOSTEFAOUI : Les communes différées en 2018 pour cause d'adressage incomplet sont-elles programmées en 2019. Nous avons par ailleurs réalisé une étude auprès des communes du Rhône qui ont répondu très largement à la demande, qui nous a permis de vérifier si leur plan d'adressage est conforme afin de ne pas pénaliser le programme de déploiement. Cela vous est-il utile ?

Hervé CRÉTIN : Oui ces communes sont reprises cette année, 12 communes 2018 avaient été retardées. L'EPARI nous a transmis une étude précise sur l'adressage : il y a une vingtaine de communes à l'étude qui pourraient poser problème. Nous les prenons en compte. Notre déploiement est calé. Les travaux démarrent nous aviserons sur place au cas par cas.

Nous sommes par ailleurs amenés à réaliser des travaux de génie civil importants pour l'amené du réseau de fibres optiques dans le nord du département, c'est pourquoi MONSOLS et ST IGNY DE VERS prévues en 2018 ont été décalées au programme de 2019.

Daniel VALÉRO : Nous vous avons interrogés sur l'utilité pour vous d'emprunter des infrastructures du réseau EPARI, vous ne nous avez apporté aucune réponse ?

Marie Claude FOUCRÉ : Pour l'instant, nous réalisons notre propre infrastructure. Mais effectivement nous sommes intéressés par toute opportunité optimisant notre déploiement, en utilisant du Génie Civil de tiers, notamment de l'EPARI, si les conditions techniques et tarifaires sont abordables et conformes avec les tarifs proposés en symétrique par Orange pour son propre génie civil.

Daniel VALÉRO : Sur retour à notre demande, nous pouvons délibérer à ce sujet.

Hervé CRETIN : concernant les validations ABF, nous rencontrons un retard au niveau du dernier lot de Villefranche sur le centre ancien, sur lequel nos demandes sont bloquées depuis 2 mois pour un différend sur le choix des couleurs. Je suis en relation avec l'adjoint en charge de l'urbanisme pour essayer de trouver une solution qui convienne aux ABF.

Hervé CRETIN : Concernant la convention initiale qui a été signée par l'Etat et le Département du Rhône avec Orange en Mars 2018, Orange a proposé au Conseil Départemental un avenant de mise à jour de ladite convention, portant notamment sur une modification de l'annexe 3 volumes annuels, en nouvelle base Insee 2014 sur 162.712 logts.

Le Rhône a délibéré en séance départementale le 14 décembre 2018 pour la signature de cet avenant.

Orange remet en séance à chaque EPCI une copie de l'avenant à la convention présenté par le Rhône, en demandant à chaque EPCI de bien vouloir présenter puis délibérer en conseil communautaire pour autoriser chaque président d'EPCI à signer cet avenant de régularisation, comme souhaite le faire le Département du Rhône.

Hervé CRÉTIN : Voici un bilan et projection par EPCI.

- AGGLO VILLFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE, 20 PMs restent à déployer, les travaux seront tous entamés en août 2019.



## CA Villefranche Beaujolais Saône


zone AMII

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés /lgts insee	locaux raccordables /lgts insee
CA de Villefranche Beaujolais Saône										
	Total communes engagées ZMD AMII as	93		4	73	27524	14689	27406	100%	54%
69264	Villefranche-sur-Saône	60	2014	0	54	20143	11180	18618	108%	60%
69092	Gleizé	11	2015	0	9	3503	1257	3377	104%	37%
69115	Limas (new)	9	2017	4	5	1779	677	1949	91%	35%
69013	Arnas	6	2015	0	5	2099	1575	1443	145%	109%

- Nouvelle ouverture commerciale : **Limas** en février 2019
- Retard de 2 mois pour un lot de PMZ à Villefranche
- Reste 20 PMZ à déployer sur la CA Villefranche
- Au programme de 2019 : 3 communes nouvelles – 7 PM

69151	Le Perréon	2
69257	Vaux-en-Beaujolais	2
69197	Saint-Étienne-des-Oullières	3

orange™

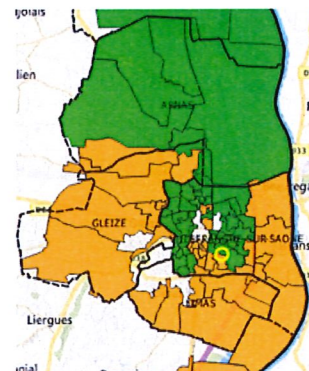

- CC VALLEE DU GARON : Le taux de complétude se lit à 5 ans, le taux de raccordement actuel est lié aux difficultés de déploiement sur certains secteurs. Nous avons noté la remarque du délégué de cet EPCI concernant la mauvaise information donnée par la boutique du CC de St Genis Laval qui renvoie les prospectus vers les mairies, nous allons y remédier.


zone AMII

## CC de la Vallée du GARON

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés /lgts insee	locaux raccordables /lgts insee
CC de la Vallée du Garon				0				0		
	Total communes engagées ZMD AMII as	51		0	51	17778	9223	12556	142%	73%
69133	Millery	6	2016	0	6	2128	1211	1737	123%	70%
69136	Montagny	5	2015	0	5	1679	513	1140	147%	45%
69043	Chaponost	12	2016	0	12	4283	1616	3421	125%	47%
69027	Brignais	22	2016	0	22	7863	4638	4905	160%	95%
69268	Vourles	6	2016	0	6	1825	1245	1353	135%	92%

- Tout est déployé au niveau PM
- Au programme de 2019 : pas de nouvelle commune

orange™





- CA VIENNE CONDRIEU, Monsieur VALÉRO demande la prise en compte de la commune d'ECHALAS qui es en attente d'un contact et qu'il faudra traiter dans le cadre du planning, comme les autres communes d'ailleurs.


## CA Vienne Condrieu

zone AMII

Code IN SEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés/lgts insee	locaux raccordables/lgts insee
Vienne Condrieu Agglo								#N/A		
	Total communes engagées ZMD AMII a	31		2	12	4686	946	8854	53%	11%
69235	Saint-Romain-en-Gal (new)	2	2015	0	2	1080	402	876	123%	46%
69189	Sainte-Colombe (new)	5	2018	1	4	1274	447	1091	117%	41%
69064	Condrieu (new)	7	2017	1	6	2309	97	1913	121%	5%

- Nouvelle ouverture commerciale : **Condrieu** en février 2019
- Réunion d'information **VCAgglo** le 20/12/2018
- Etudes préliminaires sur les artères pleine terre
- Au programme de 2019 : 9 communes pour 17 PM

69193	Saint-Cyr-sur-le-Rhône	2
69080	Échalas	2
69118	Loire-sur-Rhône	4
69119	Longes	1
69236	Saint-Romain-en-Gier	1
69252	Trèves	1
69097	Les Haies	1
69253	Tupin-et-Semons	1
69007	Ampuis	4

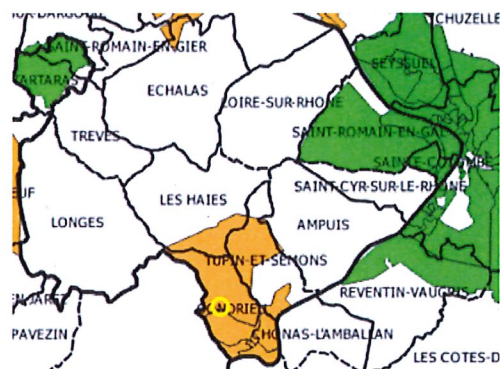

- CC PAYS DE L'OZON : Seul, SEREZIN est à ce jour déployé, 7 communes sont prises en compte en étude par CONSTRUCTEL qui prend les rdv dans les communes pour lancement de l'étude. Daniel VALÉRO fait remarquer qu'une réunion par commune est plus pertinente que de faire une réunion par EPCI.


## CC du Pays de l'Ozon

zone AMII

Code IN SEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés/lgts insee	locaux raccordables/lgts insee
CC du Pays de l'Ozon										
	Total communes engagées ZMD AMII a	34		0	4	1649	1033	10241	16%	10%
69294	Sérézin-du-Rhône	4	2016	0	4	1599	1033	1100	48%	94%

- Etudes préliminaires engagées par Constructel en décembre
- Démarrage des dossiers mairies asap
- Gros programme de 2019 :
- 7 communes pour 34 PM

69294	Sérézin-du-Rhône	4
69291	Saint-Symphorien-d'Ozon	8
69297	Ternay	7
69272	Communay	5
69270	Chaponnay	6
69281	Marennes	2
69295	Simandres	2

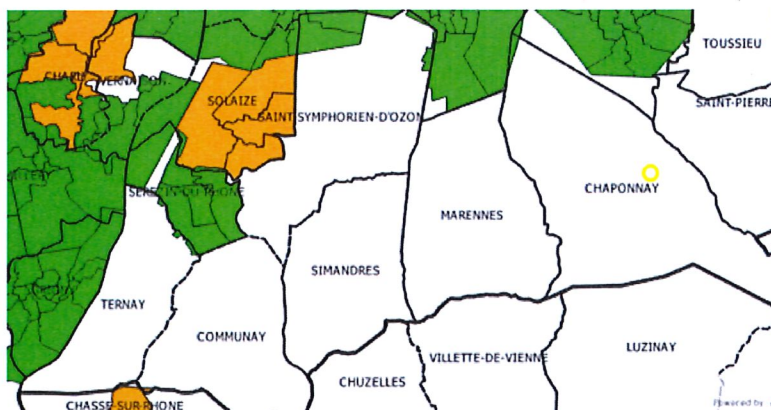



- CC PAYS MORNANTAIS : Mornant est en cours de déploiement et la commercialisation a bien démarré.


## CC du Pays Mornantais

zone AMII

EPCI	Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés/lgts insee	locaux raccordables/lgts insee
CC du Pays Mornantais	CC du Pays Mornantais	Total communes engagées ZMD AMII a	41		4	18	6242	1616	11441	55%	14%
	69148	Oriénas	3	2016	0	3	1077	285	972	70%	29%
	69241	Taluyers (new)	4	2017	0	4	1329	323	989	64%	33%
	69141	Mornant (new)	10	2017	0	10	3418	923	2451	77%	38%
	69219	Saint-Laurent-d'Agnay	4	2017	3	1	28	0	898	0%	0%
	69048	Beauvallon (Chassagny)	2	2017	1	0	78	0	501	1%	0%

- Nouvelle ouverture commerciale : **Taluyers** en nov 2018
- Réunion d'information COPAMO le 13/11/2018
- Etudes préliminaires et reprises adresses
- Pb câble pleine terre à **St Laurent Agny**, en cours
- Au programme de 2019 : Nb PM 13

69051	Chaussan	2
69179	Beauvallon (Saint-Andéol-le-Château)	3
69170	Rontalon	2
69213	Beauvallon (Saint-Jean-de-Touslas)	2
69228	Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire)	3
69180	Saint-André-la-Côte	1

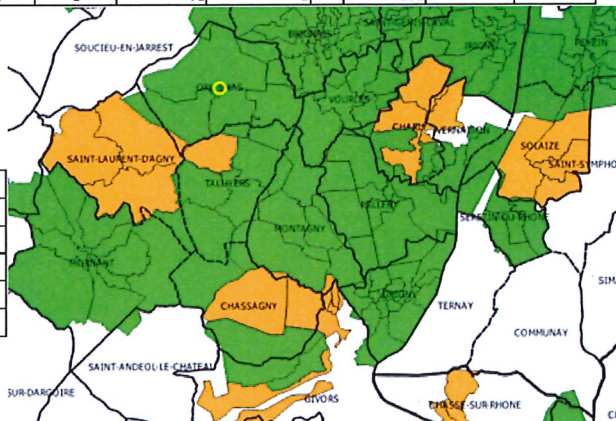

orange™


- CC SAÔNE BEAUJOLAIS : 20 communes à déployer avec du génie civil dans le Haut Beaujolais

## CC Saône Beaujolais

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés/lgts insee	locaux raccordables/lgts insee
Saône Beaujolais	Total communes engagées ZMD AMII aggro	82		4	16	6417	2668	21070	30%	13%
69206	Saint-Georges-de-Reneins	6	2016	0	6	2500	1025	1951	128%	53%
69019	Belleville	14	2015	4	10	3909	1643	3824	102%	43%

- Gros programme 2019 : 20 communes - Nb PM : 30
- Démarrage des RDV mairies par Eiffage en autonomie / Validation des emplacements
- Travaux de génie civil sur tout le Haut Beaujolais (Monsols) engagés par Orange en Janv 2019

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme
69211	Saint-Jean-d'Ardières	5
69218	Saint-Lager	2
69045	Charentay	2
69198	Saint-Étienne-la-Varenne	1
69002	Aigueperse	1
69035	Cenves	1
69036	Cercié	2
69065	Corcelles-en-Beaujolais	1
69135	Monsols	2
69150	Ourox	1
69182	Saint-Bonnet-des-Bruyères	1
69185	Saint-Christophe	1
69186	Saint-Clément-de-Vers	1
69203	Saint-Igny-de-Vers	2
69210	Saint-Jacques-des-Arrêts	1
69224	Saint-Mamert	1
69242	Taponas	2
69251	Trades	1
69016	Azolette	1
69161	Propières	1

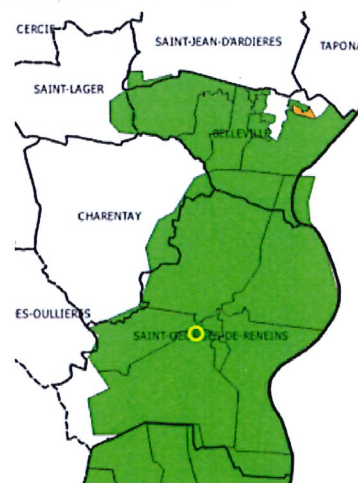

orange™



- COR : L'Ouest Rhodanien a pris un certain retard en 2018 du fait de problèmes d'adressage, liés à la fusion de communes. Le programme de cette année fera avancer notablement le déploiement du FTTH sur le territoire de cette C.A. 17 communes et 32 PM en démarrage. A ST VERAND toutes les contraintes sont levées et les travaux vont commencer.

## CA de l'Ouest Rhodanien

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés /lgts insee	locaux raccordables /lgts insee
CC Ouest Rhodanien								#N/A		
	Total communes engagées ZMDAMII agglo	85		13	4	0	0	26615	0%	0%
69073	Dareizé	1	2018	1	0	0	0	194	0%	0%
69147	Les Olmes	2	2018	2	0	0	0	336	0%	0%
69223	Saint-Loup	2	2018	1	0	0	0	440	0%	0%
69243	Tarare	16	2018	9	0	0	0	5536	0%	0%
69248	Thizy-les-Bourgs	9	2018	0	4	0	0	3456	0%	0%

- Travaux engagés sur Thizy, Dareize/St Loup/Les Olmes, Tarare
- Gros programme 2019 : 17 communes - 32 PM
- Démarrage des RDV mairies par SPIE en autonomie / Validation des emplacements
- Pontcharra sur Turdine, Ancy, St Romain de Popey

69060	Claveisolles	1
69107	Lamure-sur-Azergues	2
69183	Saint-Bonnet-le-Troncy	1
69229	Saint-Nizier-d'Azergues	2
69054	Chênelette	1
69160	Poule-les-Écharmeaux	2
69001	Affoux	1
69008	Ancy	1
69157	Pontcharra-sur-Turdine	4
69225	Saint-Marcel-l'Éclairé	1
69234	Saint-Romain-de-Popey	2
69200	Saint-Forgeux	2
69066	Cours-la-Ville	6
69130	Meaux-la-Montagne	1
69164	Ranchal	1
69214	Saint-Jean-la-Bussière	2
69240	Saint-Vincent-de-Reins	2

orange™

- CC VALLONS DU LYONNAIS :

zone AMII


## CC des Vallons du Lyonnais

C des Vallons du Lyonnais		40						#N/A		
	Total communes engagées ZMDAMII agglo	40		3	11	3523	797	11803	30%	7%
69028	Brindas (new)	9	2017	3	6	1766	94	2357	75%	4%
69131	Messimy	5	2016	0	5	1743	703	1391	125%	51%

- Nouvelle ouverture commerciale : Brindas en février 2019
- Gros programme 2019 : sur les 6 communes restantes - Nb PM : 27
- Démarrage des RDV mairies par INEO / sur Thurins et Grézieu-la-Varenne  
Validation des emplacements

69249	Thurins	4
69255	Vaugneray	7
69094	Grézieu-la-Varenne	8
69154	Pollionnay	3
69190	Sainte-Consorte	3
69269	Yzeron	2

orange™

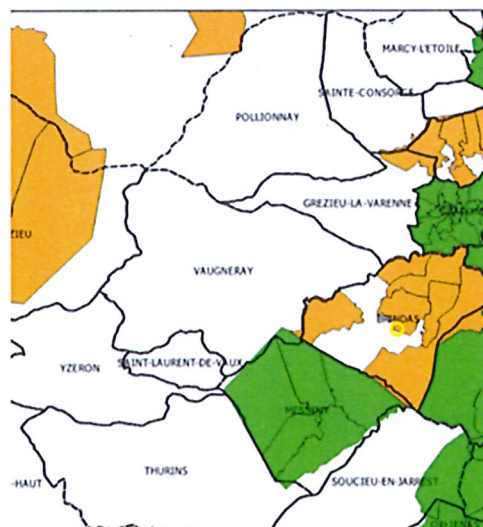

- CC MONTS DU LYONNAIS :

## CC des Monts du Lyonnais

zone AMII

Monts du Lyonnais								#N/A		
	Total communes engagées ZMD AMII aggro	52		0	9	3078	754	14094	22%	5%
69062	Coise	1	2017	0	0	28	0	317	9%	0%
69110	Larajasse	3	2017	0	0	54	0	873	6%	0%
69155	Pomeys	1	2017	0	0	132	0	467	28%	0%
69238	Saint-Symphorien-sur-Coise (new)	9	2017	0	9	2860	754	1809	158%	42%

- Nouvelle ouverture commerciale : St Symphorien sur Coise en février 2019
- Gros programme 2019 : sur les 9 communes restantes – 14 PM
- Démarrage des RDV mairies pour Validation des emplacements SPIE / INEO



69120	Longessaigne	1
69139	Montrottier	2
69263	Villechenève	2
69030	Brullioles	1
69098	Les Halles	1
69132	Meys	1
69178	Souzy	1
69220	Saint-Laurent-de-Chamousset	3
69184	Sainte-Catherine	2




- CCPA : COURZIEU qui a été retardée est en cours de déploiement, à la question de savoir si un secteur excentré sera desservi en même temps, il peut être alimenté par une autre commune voisine, en l'occurrence POLLIGNONNAY qui sera traitée approximativement dans le même calendrier. SARCEY doit démarrer

## CC du Pays de l'Arbresle

- Déblocage du dossier Courzieu : travaux en cours
- Pb câble pleine terre, en cours de résolution par du génie civil
- Au programme de 2019 : Sarcey Nb PM

69173	Sarcey	2
-------	--------	---

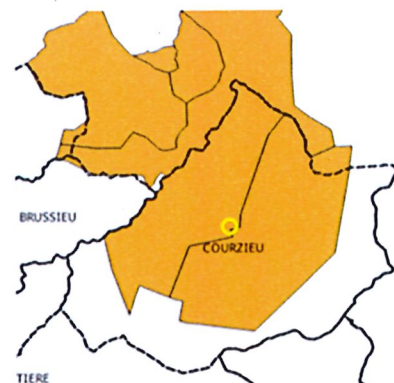



- CCEL : ST BONNET et GENAS sont commercialisés, les autres communes démarrent cette année.  
La commune de JONS a été déployée et débute la commercialisation avant d'être transférée à SFR


## CC de l'Est Lyonnais

zone AMII

Code INSEE	Commune	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	Nombre de PM En cours d'établissement	PM mis à disposition	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Nb lgts insee 2014	Locaux programmés / lgts insee	locaux raccordables / lgts insee
CC de l'Est Lyonnais		47		2	28	9836	6332	N/A		
	Total communes engagées ZMD AMII agglo	56		2	28	9836	6332	15174	65%	42%
69277	Genas	20	2016	0	20	7125	4862	4936	144%	99%
69287	Saint-Bonnet-de-Mure (new)	10	2017	2	8	2708	1470	2621	103%	56%

- Gros programme 2019 :  
sur les 5 communes restantes - Nb PM : 26
- Démarrage des RDV mairies pour  
Validation des emplacements : Pusignan et suiv.

69285	Pusignan	6
69289	Saint-Pierre-de-Chandieu	6
69288	Saint-Laurent-de-Mure	7
69298	Toussieu	4
	Colombier Saugnieu	3

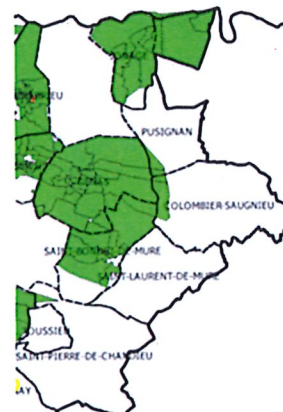

- CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES : Les communes AMII cette année les autres sont du ressort de SFR.

## CC Beaujolais Pierre Dorées

zone AMII

- Déblocage du dossier Saint Verand : départ en travaux décembre 2018 avec Mr le Maire
- Etudes préliminaires et reprises adressages; 2 PM
- Pb câble pleine terre, en cours de résolution par du génie civil engagé par Orange
- Au programme de 2019 : Nb PM

69230	Sainte-Paule	1
-------	--------------	---





# CC Pierres Dorées (cession à SFR)

Hors zone AMII

	Total communes enregistrées	21		9	12	3754	26%	5685	66%	5%
62007	Asse	9	2018	2	0	154	0	2775	6%	0%
62011	Bessenay	4	2017	0	4	1285	0	1022	126%	0%
62005	Ambérieux (rea)	1	2018	0	1	309	154	212	146%	73%
62137	Lucenay	3	2018	0	3	842	0	747	113%	0%
62106	Lachassagne	2	2018	0	2	555	0	429	128%	0%
62236	Jons (rea)	2	2017	0	2	610	111	500	122%	22%

- Démontage des 9 armoires PM sur ANSE pris en charge par Orange
- Cession des réseaux des autres communes déjà déployés
  - Commercialisables à Ambérieux et Jons
  - Adressables à Bessenay / Lucenay et Lachassagne



Il faut bien que les communes aient conscience qu'entre le 1<sup>er</sup> RDV et le début de la commercialisation il faut attendre un an et qu'il est nécessaire d'adapter la communication en ce sens.

Daniel VALÉRO remercie ORANGE. Les questions diverses ayant été traitées au fur et à mesure la séance est levée. La prochaine réunion de suivi est programmée en septembre 2019.

Daniel VALÉRO  
Vice-président délégué  
aux nouvelles technologies
